

PARTE DE INSTALACIÓN SERIE iQ6 / *iQ6 SERIES INSTALLATION FORM*



Ayuda visual al dorso / *Visual guide on the back*



FECHA INSTALACIÓN / *INSTALLATION DATE*

DIRECCIÓN / *ADDRESS*:

NOMBRE ESTABLECIMIENTO / *BUSINESS NAME*:

CORREO ELECTRÓNICO / *E-MAIL*:

TELÉFONO / *TELEPHONE No*:

MÁQUINA / <i>MACHINE</i>		VERSIÓN SOFTWARE / <i>SW VERSION</i>	
MODELO / <i>MODEL</i>	NÚMERO DE SERIE / <i>SERIAL No.</i>	INICIAL / <i>INITIAL</i>	FINAL



RETIRADA EMBALAJE / *REMOVAL OF PACKAGING*

- ☐ Laterales cuba / *Vat sides* (4)
- ☐ Superior cuba / *Vat top* (1)
- ☐ Acople de extracción / *Extraction coupling* (2)
- ☐ Interior caja de filtros / *Inside filter box* (1)

INSTALACIÓN ELÉCTRICA / *ELECTRICAL INSTALLATION*

- ☐ Diferencial exclusivo / *Exclusive circuit breaker*
- ☐ Línea 20A/25A (según modelo) / *20A/25A Power line (per model)*
- ☐ Comprobación línea eléctrica / *Power line check*
- ☐ Montaje enchufe (no incluido) / *Plug mounting (not included)*



UBICACIÓN / *PLACING*

- ☐ Espacio laterales / *Sides clearance* → Min 300mm
- ☐ Dist. fuentes de calor / *Heat sources dist.* → Min 1000mm
- ☐ Ventiladores sin obstáculos / *Fans clearance*
- ☐ Altura máquina adecuada para operación
Machine height optimal for operation
- ☐ Superficie nivelada / *Level surface*

ACCESORIOS / *ACCESSORIES INCLUDED*

- ☐ Jarra de llenado / *Filling jar*
- ☐ Embudo / *Funnel*
- ☐ Filtro de embudo / *Funnel filter*
- ☐ Tubo desagüe aceite / *Oil drainage tube*
- ☐ Tubo desagüe bidón / *Water tank drainage tube*
- ☐ Codo grifo bidón / *Water tank tap elbow*



COMPROBACIONES / *CHECKINGS*

- ☐ Ajuste cierre puerta / *Door lock adjustment*
- ☐ Sistema bloqueo cuba / *Vat locking system*
- ☐ Fijación rampa de salida / *Exit ramp tightened*
- ☐ Ajuste altura patas / *Leg height adjustment (max)*
- ☐ Apriete racores / *Fittings adjustment*
- ☐ Grifo bidón cerrado / *Water tank tap closed*
- ☐ Fijación correcta grifo cuba / *Vat tap correct fixing*
- ☐ Movimiento libre flotador / *Easy floater movement*
- ☐ Actualización SW / *SW Update*
- ☐ Reseteo contadores / *Counter reset*

FORMACIÓN BÁSICA USUARIO / *BASIC USER TRAINING*

- ☐ Llenado frontal aceite FRÍO / *Front filling COLD oil*
- ☐ Rellenado en CALIENTE con embudo
Refilling HOT oil using the Funnel
- ☐ Filtrado aceite DIARIO / *DAILY oil filtering*
- ☐ Pantalla y menús / *Screen and menus*
- ☐ Conexión cable acodado y estado junta circular
Elbow cable connection and round gasket condition
- ☐ Inserción-extracción cuba / *Vat coupling-uncoupling*
- ☐ Aviso cambio de filtro → Mantenimiento obligatorio
Filter change warning → Mandatory maintenance

MONTAJE-DESMONTAJE / *ASSEMBLY-DISASSEMBLY*:

- ☐ Componentes cuba / *Vat components*
- ☐ Codo de extracción / *Extraction elbow*
- ☐ Filtro de grasa metálico / *Grease metal filter*
- ☐ Montaje y desmontaje Carrusel
Carousel assembling & disassembling
- ☐ Registro Mantenimiento y Garantía (Guía rápida)
Maintenance Log and Warranty (Quick Start Guide)
- ☐ Recordatorio descarga Manual Usuario (QR Guía Rápida)
User Manual Download (QR Quick Start Guide)


OBSERVACIONES / *REMARKS*

FIRMA TÉCNICO-EMPRESA / *TECHNICIAN-COMPANY SEAL*


FIRMA CLIENTE / *CUSTOMER SIGN*

AYUDA VISUAL INSTALACIÓN SERIE iQ6 / iQ6 SERIES SET UP VISUAL GUIDE

1 COLOCACIÓN PLACING

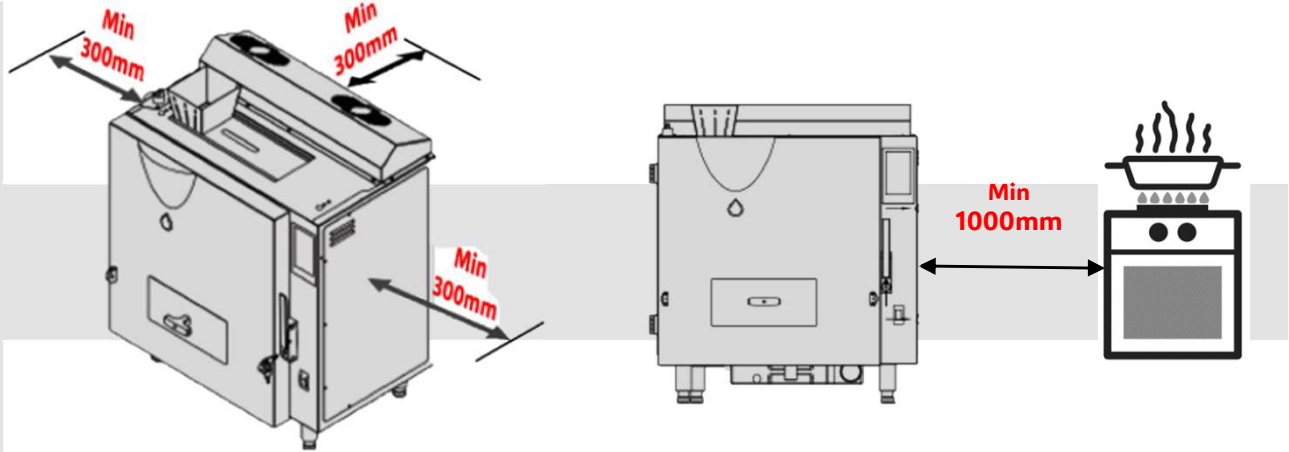


2 RETIRADA EMBALAJE PACKAGING REMOVAL

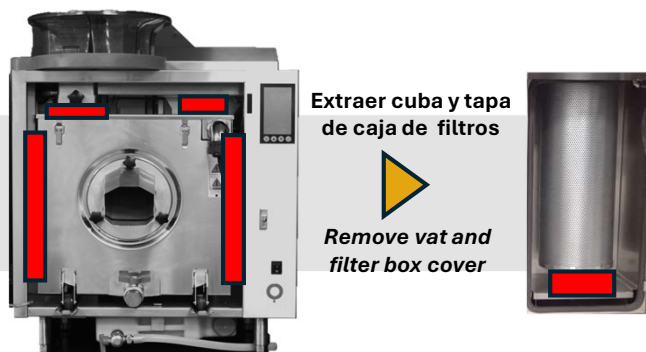


3 COMPROBACIÓN ELÉCTRICA POWER LINE CHECK

*Imagen enchufe orientativa, valores según país
*Indicative socket image, values as per country

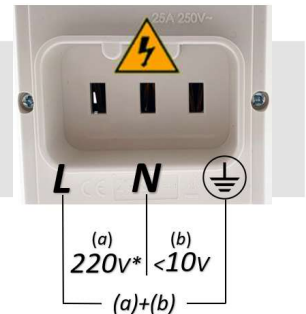

4 ANTES DE ENCENDER LA MÁQUINA


BEFORE STARTING UP THE MACHINE



Movimiento libre flotador
Free float movement



Grifo bidón cerrado
Water tank tap closed



Cuba completamente encajada
Vat firmly engaged




Acople extracción completamente apoyado en cuba y fijado
Extraction coupling fully lowered and fixed



Rampa de salida fijada
Exit ramp fixed




Cable acodado apretado
Elbow cable fully tightened



Junta redonda en buen estado
Round gasket in good condition

5 PASOS FINALES FINAL STEPS



¡Actualizar máquina - Resetear contadores!
Update machine - Reset counters!



MANTENIMIENTO 5000 RACIONES / 5000 PORTIONS MAINTENANCE			
RACIONES REALIZADAS / CURRENT PORTIONS MADE		FECHA / DATE	
Cambio filtro cartucho / Cartridge filter replacement		OBSERVACIONES / REMARKS	
Cambio junta(s) / Gaskets replacement (s)			
Cambio manguera y resacas / Hoses & fittings replacement			
Revisión estado componentes / Components condition check			
Estado Limpieza / Overall cleaning condition	OK	INDIC	FIRMA TÉCNICO / TECHNICIAN SIGNATURE
Buena conservación / Good maintenance	OK	INDIC	
Verificación de peso / Weight verification	OK	INDIC	
Cable acodado / Elbow cable	OK	INDIC	
Cable eléctrico / Electric cable	OK	INDIC	
Cable / Cable	OK	INDIC	
Si / If	OK	INDIC	
Si / If	OK	INDIC	
Actualización SW / SW Update	OK	INDIC	
Test Pressure / Pressure test	OK	INDIC	

Recuerde al cliente descargar el manual y realizar los mantenimientos obligatorios cada 5000 raciones
Remember customer to download the manual and perform the mandatory maintenance every 5000 portions
